

Aan Provinciale Staten

Onderwerp **PS-rapportage T3-2024 Aanpak Ring Zuid**

Dossiernummer	K2860
Documentnummer	2025-030236
Datum GS	1 april 2025
Behandelaar	Stuij, Ed
Telefoonnummer	050 - 3164509/06 - 27051028

Geachte Statenleden,


Aanleiding

In de statencommissie hebben wij u toegezegd uw Staten periodiek te informeren over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid. Drie keer per jaar sturen wij een rapportage op basis van de Trimester-rapportages van het project die voor de projectverantwoording door Rijkswaterstaat worden opgesteld. En vanzelfsprekend informeren wij u tussentijds als er belangrijke ontwikkelingen zijn die niet tot de volgende rapportage kunnen wachten.

Hierbij sturen wij u de PS-rapportage over de periode september - december 2024. Een rapportage van gelijke strekking wordt door het college van B&W van de gemeente Groningen aan de raad gestuurd.

RoI PS

U ontvangt deze rapportage ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.

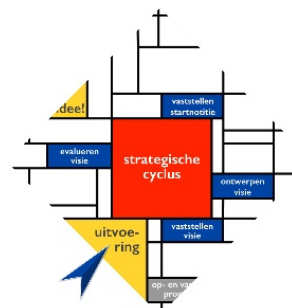

Nadere toelichting

Opening Ringweg

Na de opening in september 2024 is er hard doorgewerkt aan de afwerking en definitieve inrichting van het onderliggende wegennet en de realisatie van het Zuiderplantsoen. Er blijft veel aandacht voor de kwaliteit van de afwerking en de veiligheid van de infrastructuur.

Zuiderplantsoen en Esperantotunnel

Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van het Zuiderplantsoen. Met de aannemer is afgesproken dat het park op uiterlijk 8 mei gereed is. De officiële opening van het Zuiderplantsoen zal naar verwachting na de zomervakantie worden gepland en zal gepaard gaan met diverse festiviteiten.

Bezorgde bewoners hebben de plannen voor het Zuiderplantsoen en dan met name het Sterrebos met een burgeragendering geagendeerd bij de gemeenteraad. De zorgen hebben vooral betrekking op de aanleg van een nieuwe pad en het vervangen van oude paden.

De Esperantotunnel (een wens van bewoners) biedt fietsers en voetgangers de mogelijkheid om zich door het gehele park te kunnen verplaatsen. Het zorgt ervoor dat het park voor bezoekers één geheel vormt. Bij de realisatie van de fietstunnel zijn in november lekkages geconstateerd waardoor veel zand is weggespoeld. Dit leidde tot verzakkingen van het spoor. In een intensieve samenwerking tussen ProRail, Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid zijn binnen een week tijd noodmaatregelen getroffen om de situatie te stabiliseren. Voor een definitieve oplossing wordt geprobeerd om aan te sluiten op de treinvrije periode die in de zomer staat gepland.

Máximaweg en Herewegviaduct

In december 2024 werden de Máximaweg en Hereweg opengesteld voor verkeer. Dit nieuwe tracé vormt een belangrijke schakel in de infrastructuur. Om deze opening te markeren en de omgeving te betrekken, is op 20 december een kerstmarkt georganiseerd, speciaal voor de bewoners van omliggende wijken zoals Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoortwijk en De Wijert-Noord.

Brailleweg en Expositielaan

De werkzaamheden rond Julianaplein, de Brailleweg en de Expositielaan zijn bijna afgerond. De nieuwe afrit vanaf Drachten naar de Brailleweg is inmiddels geopend, waardoor er na 14 jaar opnieuw vanaf de A7 een directe aansluiting is met het stationsgebied. In de komende maanden wordt gewerkt aan de aanleg van een fietspad langs het Noord-Willemskanaal, evenals aan de inrichting van de Julianavijver en Braillevijver. De Expositielaan en de aansluiting op de Paterswoldseweg zijn opnieuw ingericht, waarmee de bereikbaarheid van MartiniPlaza en het Mercure Hotel is verbeterd. De westelijke ringweg is op 28 februari 2025 feestelijk geopend en overgedragen aan de provincie.

Faunapassage Ketwich Verschuurbrug

De faunapassage onder van Ketwich Verschuurbrug is in het najaar gerealiseerd. Samen met de roeiverenigingen is gekozen voor een oplossing die een goede verbinding biedt voor fauna en tegelijkertijd de roeiers niet in de weg zit.

Communicatie en bewonersbetrokkenheid

Om omwonenden en belanghebbenden bij de inrichting te betrekken, is op 23 en 24 januari een inloopbijeenkomst georganiseerd over het

Zuiderplantsoen en het Geheugenpaviljoen. Tijdens deze bijeenkomsten kregen bezoekers de gelegenheid om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Hoewel de ringweg inmiddels in gebruik is, blijven er nog werkzaamheden in de omliggende gebieden. De impact hiervan op bewoners en weggebruikers wordt zoveel mogelijk beperkt, onder andere door tijdelijke voorzieningen zoals extra fietspaden en tijdige communicatie over omleidingen.

Afsluitend

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Groningen, 1 april 2025

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

René Paas, voorzitter

Hans Schrikkema, secretaris

Bijlagen

Nr.	Titel	Doumentnummer
1	PS-rapportage ARZ T3-2024	2025-029465
